



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PREFEITURA - PREFEITURA**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - PREFEITURA (11.02.23.05)  
(Identificador: 202231635)**

**Nº do Protocolo: 23125.003662/2021-08**

**Macapá-AP, 23 de Fevereiro de 2021.**

**Título: Solicitação de Reajuste de Preço - Contrato Nº16/2020-UNIFAP - CANTUARIA & CIA LTDA**

**À PROAD**

**Senhor Pró-Reitor,**

Solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto ao pedido da empresa CANTUARIA & CIA LTDA de Reajustamento de Preço ao valor do **Contrato Nº 016/2020 – UNIFAP**, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Marco Zero, Município de Macapá-AP, que será prestado nas condições estabelecidas nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual", conforme Relatório Fiscal Técnico, datado em 22 de fevereiro de 2021.

Seguem anexos Ofício encaminhado pela contratada e o Relatório da Fiscalização Técnica com parecer favorável ao reajuste de preço.

*(Autenticado em 23/02/2021 10:33)*  
RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **0967ec6daf**

Copyright 2007 - Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - UNIFAP

Ofício Cantuária nº 048/2020

Santana-AP, 21 de Outubro de 2020.

**PROCESSO Nº 23125.033391/2019-56****TOMADA DE PREÇOS 04/2019 - CPL/UNIFAP**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Marco Zero, município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Senhor Prefeito,

A empresa **CANTUÁRIA & CIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ 10.843518/0001-40, sediada no Município de Santana, Estado do Amapá, por intermédio do seu representante legal, o Senhor **PAULO SERGIO DA SILVA MELO**, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria **REQUERER** reajuste de preços, visto que já se decorreu 01(UM) Ano da Planilha de Referência de Outubro/**2019** do contrato que tem como objeto a **Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Marco Zero, município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos** e com amparo e sustentação da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, fornecendo, para tanto, caso sejam exigidas, as notas fiscais necessárias para a satisfação das exigências legais.

**TEXTUAIS RETIRADAS DO EDITAL****12. DO REAJUSTE**

12.1. Os preços são fixos.

12.1.1. O preço do serviço contratado poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da apresentação da proposta;

12.1.2. O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha substituí-lo.

12.2. O pedido de reajuste, quando requerido pela Contratada, deverá ser instruído com uma composição de custos atualizados e demais documentos comprobatórios.

12.2.1. O direito de reajuste deve ser oportunamente pleiteado pela Contratada, sob pena de ocorrência do instituto da preclusão lógica ao seu direito;

12.2.2. A preclusão lógica se opera a cada ato praticado pela empresa incompatível com o efetivo exercício de seu direito;

12.2.3. Cabe à Contratada, atendida a periodicidade anual prevista em lei, solicitar o reajustamento de preços ou, a cada nota fiscal (com planilha de preços) remetida à Administração para pagamento, contemplar o reajuste nos valores apresentados ou resguardar expressamente seu direito ao reajustamento.

12.2.4. É vedada a inclusão, por ocasião de reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal.

Certo de sermos atendidos, e sem mais para o momento, aguardamos vossos deferimento.

Atenciosamente,



**Paulo Sérgio da Silva Melo**  
CPF: 104.223.572-04  
Administrador - CRA nº 0-01273  
Tec em Edificações-CREA 031132927-1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO

CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140

ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste

**1. DADOS GERAIS DO CONTRATO**

PROCESSO Nº 23125033391/19-56

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019 - Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Universitário Marco Zero, Macapá - AP. - <http://www.unifap.br/editais/tomada-de-preco-no-04-2019/>

Valor Estimado pela Administração: R\$ 1.023.462,65

Valor do contrato: R\$803.054,66

Prazo de execução da obra: 150 dias a contar da ordem de serviços / cronograma

Percentual de Desconto da licitação: 21,54%

**2. DADOS DA CONTRATADA**

Contratada: CANTUARIA & CIA LTDA -

Razão Social	CANTUÁRIA E CIA LTDA		
CNPJ n.º:	10.843.518/0001-40	Ins. Estadual:	03.033788-7
Endereço:	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1030, PARAÍSO		
Cidade/UF	SANTANA/AMAPÁ	CEP:	68.928-081
Fone:	96 4141-3470/98115-0558	Fax:	XXXXXX
Email	p-sergio-melo@bol.com.br		
Dados Bancários:	CAIXA ECONIMICA FEDERAL. AGÊNCIA: 3102 CONTA CORRENTE: 1528-5		
Representante:	Paulo Sérgio da Silva Melo		
Endereço:	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1030, PARAÍSO, SANTANA/AP.		
CPF/MF:	106.223.572-04	RG:	043.781 SSP/AP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO

CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140

ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste

### 3. LOCALIZAÇÃO DA OBRA



Foto 1 – Campus Marco Zero do Equador – Macapá – AP. Fonte: Google Earth, 11/2019

### 4. HISTÓRICO DE PRAZOS DO CONTRATO

Assinatura do Contrato: 22 de janeiro de 2020.

Ordem de Serviços: 06/2020 – 21/02/2020 a 27/07/2020



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO

CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140

ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste

5. ORDEM DE SERVIÇOS

**ORDEM DE SERVIÇO**

**Nº 06/2020 – AEEA**

Pela presente Ordem de Serviço fica autorizada a empresa **Empresa CANTUÁRIA & CIA LTDA — ME**, a partir do dia **21 de fevereiro de 2020**, a dar início aos serviços conforme especificações técnicas decorrente da **Tomada de Preços Nº04/2019 e Contrato Nº 016/2020-UNIFAP**.

Fica registrado que: Objeto, Prazo e Valor dos serviços contratados são respectivamente:


**Objeto:** É a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Marco Zero, Município de Macapá-AP, que será prestado nas condições estabelecidas nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

**Prazo:** O prazo para vigências do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato (03/02/2020 a 30/09/2020).

O prazo para execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão desta da ordem de serviço (21/02/2020 a 27/07/2020).

**Valor:** O valor deste contrato é de **RS 803.054,66 (oitocentos e três mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)**.

Macapá-AP, 21 de fevereiro de 2020.

  
**Raimundo Brazão do Rosário**  
Assessor Especial de Eng. e Arquitetura  
Port. 1680/2018-UNIFAP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

---

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO  
CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140  
ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste

## 6. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

### DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 03/02/2020 | Edição: 23 | Seção: 3 | Página: 90  
Órgão: Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Amapá

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2020 - UASG 154215

Nº Processo: 23125033391201956.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO - AMAPA. CNPJ Contratado: 10843518000140. Contratado : CANTUARIA & CIA LTDA -Objeto: Reforma e ampliação da UBS-Marco Zero. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 03/02/2020 a 30/09/2020. Valor Total: R\$803.054.66. Fonte: 8188000000 - 2019NE800599. Data de Assinatura: 22/01/2020.

(SICON - 31/01/2020) 154215-15278-2019NE800005

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

## 7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

**CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO**  
**CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140**  
**ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

**PORTARIA Nº 0259/2020**

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regimentais e em observação ao disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993; no art. 31 da Instrução Normativa nº 02/2008 - MPOG, alterado pela Instrução Normativa nº 06/2013 - MPOG, tendo em vista o que consta no Processo Nº 23125.035031/2019-99, de 10 de Dezembro de 2019, e no Despacho Nº 3999/2020 - SECPREF, de 17 de Fevereiro de 2020.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar os servidores constantes em anexo para responderem pela gestão e fiscalização do Contrato nº 016/2020, celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ e a Empresa CANTUÁRIA & CIA LTDA ME, o qual tem como objeto "a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Marco Zero, Município de Macapá-AP, que será prestado nas condições estabelecidas nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual".

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

*Pró-Reitoria de Administração da Fundação Universidade Federal do Amapá*

Homologado em 17/02/2020 por 1125822 - SELONIEL BARROSO DOS REIS, com as atribuições conferidas pelo(a) Portaria nº 1610/2018-UNIFAP, e pelo(a) Ordem de Serviço nº 001/2016-REITORIA/UNIFAP.

**ANEXO DA PORTARIA**

**GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2020**  
**EMPRESA CANTUÁRIA & CIA LTDA — ME**

Servidor	Cargo Efetivo	Matricula SIAPE	Função
Raimundo Brazão do Rosário	Arquiteto e Urbanista	2001390	Gestor(a) do Contrato
Cairo Cardoso Madureira	Arquiteto e Urbanista	2082250	Gestor(a) do Contrato (Suplente)
Cristiane Lameira Vasconcellos	Engenheira Civil	1790220	Fiscal Técnico
Amanda Monteiro Pinto Barros	Engenheiro de Segurança do Trabalho	3065495	Fiscal Técnico
João Ricardo Brito Pinheiro	Engenheiro Eletricista	1937279	Fiscal Técnico
Amanda Leticia Baísta da Silva	Engenheira Sanitarista	1362145	Fiscal Técnico
Cledinei Santana Amanajás	Engenheiro Civil	2158032	Fiscal Técnico (Suplente)
Gustavo Hebron Pinheiro Menezes	Técnico em Segurança do Trabalho	2281488	Fiscal Técnico (Suplente)
Alex Carlos Silva da Silva	Auxiliar em Enfermagem	3055377	Fiscal Administrativo
José Adolfo Homobono Machado Bittencourt	Farmacêutico	1652610	Fiscal Administrativo (Suplente)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
 ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO

CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140

ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste

**8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA INICIAL**

		<b>Cronograma Físico e Financeiro</b>				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	95,29%	1,57%	1,57%	1,57%
		43.235,01	41.198,64	678,79	678,79	678,79
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		87.350,62	43.675,31	43.675,31		
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%	10,00%	40,00%	50,00%	
		34.076,42	3.407,64	13.630,57	17.038,21	
4	COBERTURA E FORRO	100,00%	15,00%	50,00%		35,00%
		55.802,44		8.370,37	27.901,22	19.530,85
5	ESQUADRIAS	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		47.855,74		14.356,72	19.142,30	14.356,72
6	REVESTIMENTOS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		61.130,79		12.226,16	30.565,40	18.339,24
7	PINTURA	100,00%			30,00%	70,00%
		16.563,78			4.969,13	11.594,65
8	LOUÇAS E METAIS	100,00%				100,00%
		17.212,04				17.212,04
9	EQUIPAMENTOS	100,00%			30,00%	70,00%
		123.725,23			37.117,57	86.607,66
11	INSTALAÇÕES	100,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
		189.729,27	18.972,93	75.891,71	75.891,71	18.972,93
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		44.615,08				44.615,08
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	14,63%	23,75%	29,84%	31,78%
		81.758,24	11.961,23	19.417,58	24.396,66	25.982,77
Porcentagem			14,85%	23,44%	29,6%	32,11%
Custo			119.215,75	188.247,20	237.700,98	257.890,73
Porcentagem Acumulado			14,85%	38,29%	67,89%	100,0%
Custo Acumulado			119.215,75	307.462,95	545.163,93	803.054,66

Paulo Sérgio da Silva Melo  
 CPF: 104.823.572-04  
 Administrador - CREA nº 0-01273  
 Tec em Edificações - CREA 03112971-2

SANTANA-AP, 30 DE DEZEMBRO DE 2019





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO

CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140

ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste

### IMPLANTAÇÃO

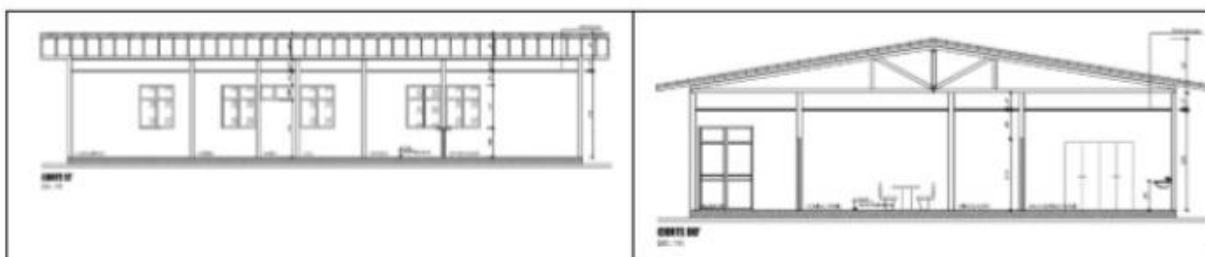
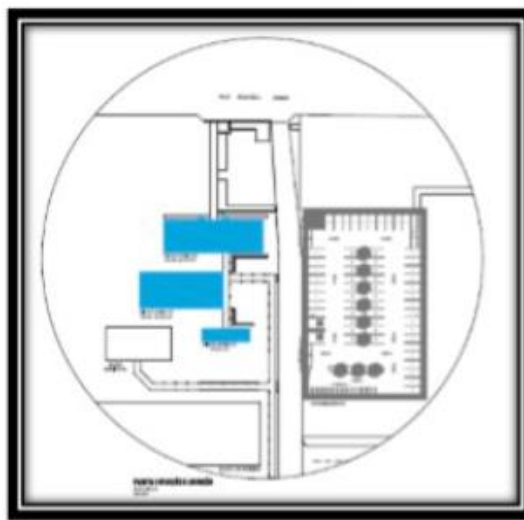


### BLOCOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

**CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO**  
**CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140**  
**ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste**

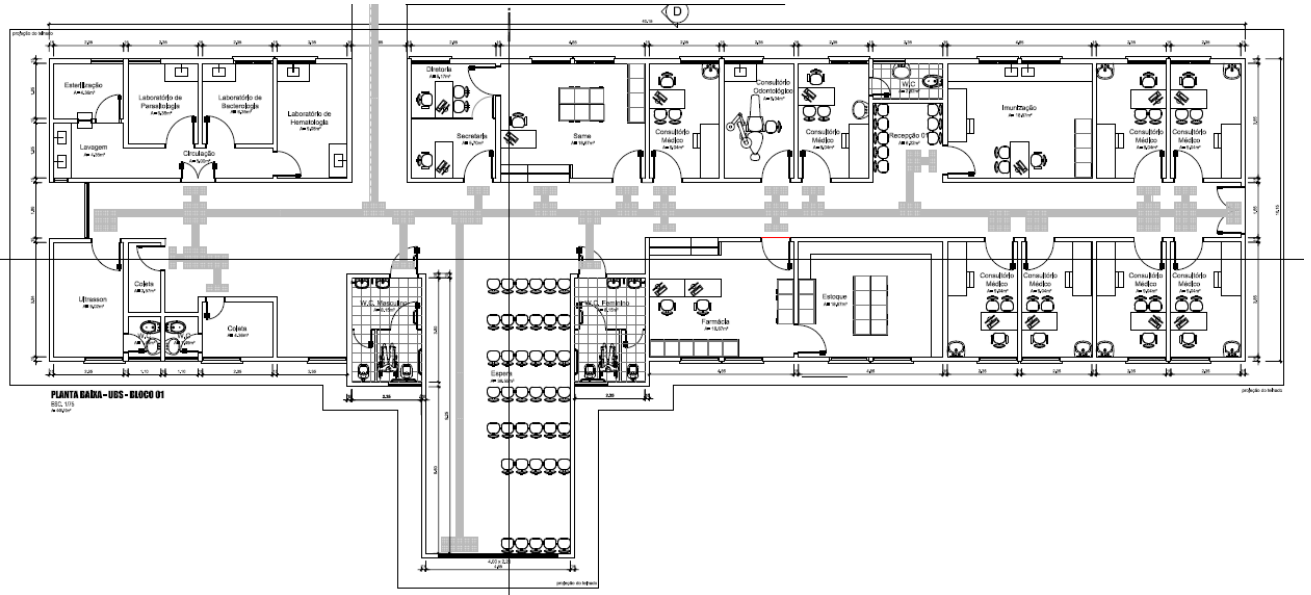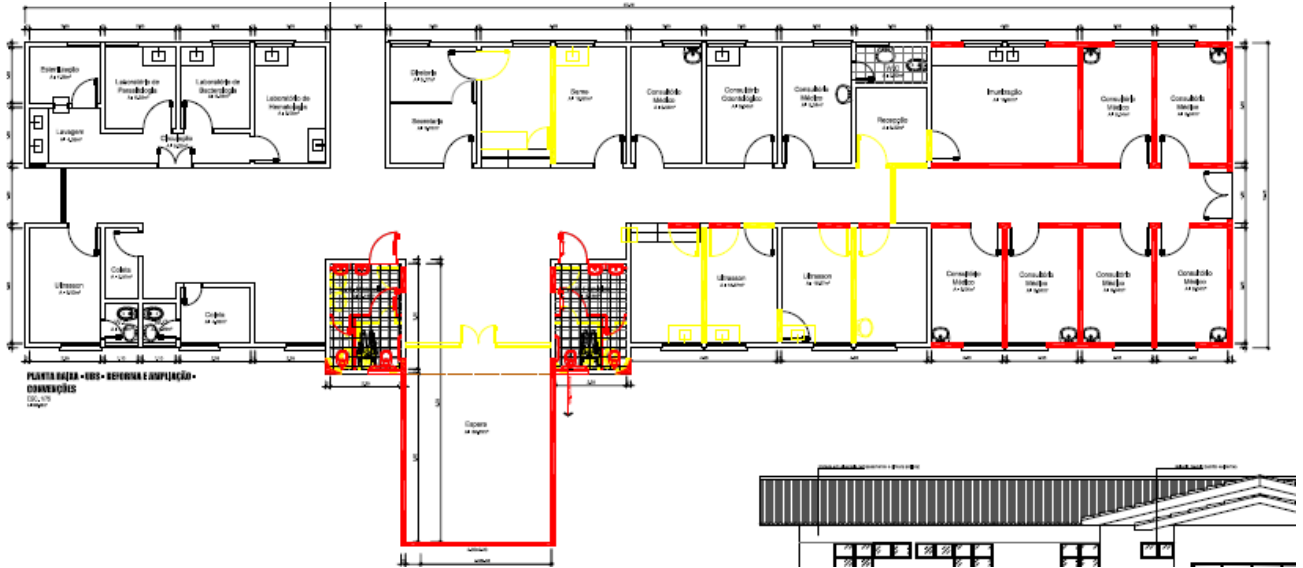


Bloco 1





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO  
CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140  
ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste

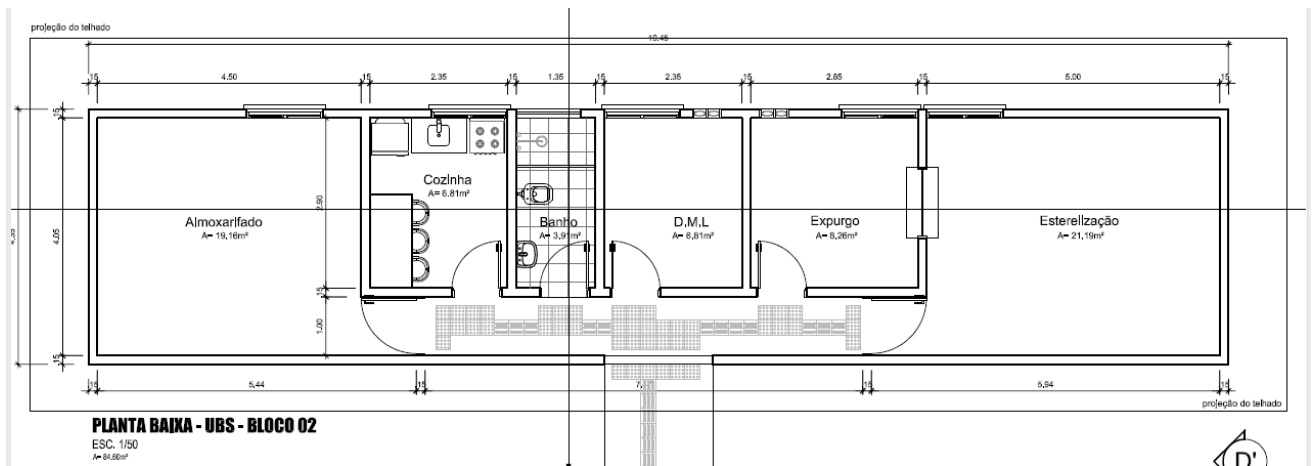

Bloco 3



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO

CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140

ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste

**9. HISTÓRICO DE MEDIÇÕES**

	PREVISTO	ACUMULADO	REALIZADO	ACUMULADO	SALDO
MEDIÇÃO 01	R\$ 119.215,75	R\$ 119.215,75	R\$ 75.777,78	R\$ 75.777,78	R\$ 727.276,88
MEDIÇÃO 02	R\$ 188.247,20	R\$ 307.462,95	R\$ 210.943,13	R\$ 286.720,91	R\$ 516.333,75
MEDIÇÃO 03	R\$ 237.700,98	R\$ 545.163,93	R\$ 93.554,95	R\$ 380.275,86	R\$ 422.778,80
MEDIÇÃO 04	R\$ 257.890,73	R\$ 803.054,66	R\$ 211.369,91	R\$ 591.645,77	R\$ 211.408,89
MEDIÇÃO 05			R\$ 19.279,50	R\$ 610.925,27	R\$ 192.129,39
	R\$ 803.054,66		R\$ 610.925,27		

**10. PEDIDO DE REAJUSTE**

Em resposta Ofício Cantuária nº 048/2020 de 21 de outubro de 2020 que trata do pedido de reajuste, temos a mencionar primeiramente que a contratada não apresentou outro documento comprobatório além do Ofício, conforme expresso no item 12,2 do contrato.

No mais, o saldo de serviços correspondente à planilha contratual da obra é de R\$ 192.129,39, conforme item 9 do histórico de medições. Desse modo, considerando o catálogo FGVDados, os Índices Nacionais de Custo da Construção – M (INCC-M) da Fundação Getúlio Vargas são: Outubro/2019 = 773.273. e Outubro/2020 = 824.636.

Assim, o valor do reajustamento é R\$ 12.129,78

Io=	773,273	índice correspondente à data base da proposta (data prevista para abertura da licitação);	out/19
I1=	824,636	índice correspondente à data para qual se deseja reajustar o valor	out/20
R=	R\$ 12.761,78	valor do reajustamento procurado;	
Vo=	R\$ 192.129,39	saldo original da proposta, na data base (valor a ser reajustado);	
V1=	R\$ 204.891,17	preço final já reajustado	
Ir	0,066422855	índice de reajustamento	
	1,066422855	Índice de variação no período	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020**

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO

CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140

ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste

Índice para correção: INCC-M  
Data inicial: 01/10/2019  
Data final: 01/10/2020  
Valor a atualizar: R\$ 192.129,39  
Índice variação no período: 1,0664229  
Valor atualizado: **R\$ 204.891,17**

Data	INCC-M - Fechamento mensal (%)(1000370)	INCC-M - 1º Decêndio (%)(1000379)	INCC-M - 2º Decêndio (%)(1000386)	INCC-M(200071)
09/2019	0.60	0.50	0.67	772.310
10/2019	0.12	0.11	0.10	773.273
11/2019	0.15	0.29	0.24	774.421
12/2019	0.14	-0.12	0.00	775.490
01/2020	0.26	0.20	0.17	777.470
02/2020	0.35	0.37	0.44	780.184
03/2020	0.38	0.34	0.37	783.150
04/2020	0.18	0.16	0.22	784.523
05/2020	0.21	0.18	0.21	786.132
06/2020	0.32	0.27	0.25	788.616
07/2020	0.84	0.19	0.64	795.235
08/2020	0.82	1.26	0.96	801.777
09/2020	1.15	0.88	0.98	810.965
10/2020	1.69	1.26	1.50	824.636

1

É o que temos. Para ciência e considerações.

#### 11. REGISTRO FOTOGRAFICO

Os registros fotográficos lançados no SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle de Obra do Ministério da Educação, sob o número ID 47706, assim como os documentos diversos relacionados ao contrato.

Macapá – AP, 22 de fevereiro de 2021.  
Cristiane Lameira Vasconcellos  
Fiscalização Técnica

<sup>1</sup> <http://www14.fgv.br/fgvdados20/default.aspx>. Acesso em 30 de outubro de 2020





**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**  
**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E**  
**CONTRATOS**

EMITIDO EM 23/02/2021 08:05



**DOCUMENTO**  
**23125.003641/2021-90**

Cadastrado em 22/02/2021 19:14



Documento disponível para recebimento com  
código de barras/QR Code

**Número:**

18/2021

**Unidade de Origem:**

DIVISÃO DE PROJETO - DIVPROJ (11.02.23.05.03)

**Identificador:**

---

**Ano:**

2021

**Tipo do Documento:**

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

**Assunto Detalhado:**

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140 ASSUNTO: Ofício Cantuária nº 048/2020. Pedido de Reajuste. A pedido da chefia, manutenção apenas do item 12 do relatório cadastrado no SIPAC 23125.000799/2021-97 e 23125.020708/2020-34

**Nome(s) do Interessado(s):**

SECRETARIA DA PREFEITURA - SECPREF

**E-mail:**

---

**Identificador:**

1102230505

**Observação:**

A pedido da chefia, manutenção apenas do item 12 do relatório cadastrado no SIPAC 23125.000799/2021-97 e 23125.020708/2020-34

**MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS**

Data Envio	Destino
22/02/2021 19:14	SECRETARIA DA PREFEITURA - SECPREF (11.02.23.05.05)
