



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PREFEITURA - PREFEITURA**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 78/2020 - PREFEITURA (11.02.23.05)
(Identificador: 202123557)**

Nº do Protocolo: 23125.013712/2020-67

Macapá-AP, 27 de Julho de 2020.

Título: Solicitação de aditivo prazo - Contrato Nº16/2020-UNIFAP - CANTUARIA & CIA LTDA

À PROAD

Senhor Pró-Reitor,

Solicito a Vossa Senhoria providências de aditamento de prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar do **dia 27/07/2020 à 25/09/2020** ao **Contrato nº 16/2020 - UNIFAP** da Empresa CANTUARIA & CIA LTDA, o qual tem como objeto a "contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Marco Zero, Município de Macapá-AP, que será prestado nas condições estabelecidas nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual".

Seguem anexos documento encaminhado pela contratada e o relatório da fiscalização com parecer favorável ao aditivo de prazo.

(Autenticado em 27/07/2020 20:10)

RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO

ASSESSOR ESPECIAL - TITULAR

Matricula: 2001390

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **177daaaa2b**

Copyright 2007 - Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - UNIFAP

CONFRIO

Refrigeração ambiente correta

CANTUÁRIA & CIA LTDA- ME

CNPJ. 10.843.518./0001-40 / INSC. EST. 03.033.788-7

INSC. MUN.1001971

Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020.

Santana-AP, 14 de julho de 2020.

Ao Senhor Prefeito do Campus Macapá Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

REF.: Contrato nº 016/2020-UNIFAP, cujo objeto é a “Execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), da Universidade Federal do Amapá UNIFAP, no Campus Marco Zero do Equador, na cidade de Macapá-AP”, e a Portaria nº 0259/2020.

ASSUNTO: Ratificação a C_Cantuária nº16/2020.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste ratificar a C_Cantuária nº16/2020, em relação ao Aditamento do Contrato nº16/2020, reencaminhamos planilhas de aditivo para apreciação e solicitamos o aditivo de prazo por mais 60(sessenta) dias, visto que o contrato supracitado se encerrará no dia 27.07.2020, para vossa apreciação e deferimento.

Atenciosamente:


CONFRIO

Refrigeração ambiente correta

CANTUÁRIA & CIA LTDA- ME

CNPJ. 10.843.518./0001-40 / INSC. EST. 03.033.788-7

INSC. MUN.1001971


Paulo Sérgio da Silva Melo
CPF: 104.223.572-04
Administrador - CREA nº 0-01273
Tec em Edificações-CREA 031132922-1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO
CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140
ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

1. DADOS GERAIS DO CONTRATO

PROCESSO Nº 23125033391/19-56

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019 - Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Universitário Marco Zero, Macapá - AP. - <http://www.unifap.br/editais/tomada-de-preco-no-04-2019/>

Valor Estimado pela Administração: R\$ 1.023.462,65

Valor do contrato: R\$803.054,66

Prazo de execução da obra: 150 dias a contar da ordem de serviços / cronograma

Percentual de Desconto da licitação: 21,54%

2. DADOS DA CONTRATADA

Contratada: CANTUARIA & CIA LTDA -

Razão Social	CANTUÁRIA E CIA LTDA		
CNPJ n.º:	10.843.518/0001-40	Ins. Estadual:	03.033788-7
Endereço:	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1030, PARAÍSO		
Cidade/UF	SANTANA/AMAPÁ	CEP:	68.928-081
Fone:	96 4141-3470/98115-0558	Fax:	XXXXX
Email	p-sergio-melo@bol.com.br		
Dados Bancários:	CAIXA ECONIMICA FEDERAL. AGÊNCIA: 3102 CONTA CORRENTE: 1528-5		
Representante:	Paulo Sérgio da Silva Melo		
Endereço:	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1030, PARAÍSO, SANTANA/AP.		
CPF/MF:	106.223.572-04	RG:	043.781 SSP/AP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO

CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140

ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

3. LOCALIZAÇÃO DA OBRA



Foto 1 – Campus Marco Zero do Equador – Macapá – AP. Fonte: Google Earth, 11/2019

4. HISTÓRICO DE PRAZOS DO CONTRATO

Assinatura do Contrato: 22 de janeiro de 2020.

Ordem de Serviços: 06/2020 – 21/02/2020 a 27/07/2020



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO
CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140
ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

5. ORDEM DE SERVIÇOS

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 06/2020 – AEEA

Pela presente Ordem de Serviço fica autorizada a empresa **Empresa CANTUÁRIA & CIA LTDA — ME**, a partir do dia **21 de fevereiro de 2020**, a dar início aos serviços conforme especificações técnicas decorrente da **Tomada de Preços Nº04/2019 e Contrato Nº 016/2020-UNIFAP**.

Fica registrado que: Objeto, Prazo e Valor dos serviços contratados são respectivamente:


Objeto: É a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Marco Zero, Município de Macapá-AP, que será prestado nas condições estabelecidas nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

Prazo: O prazo para vigências do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato (03/02/2020 a 30/09/2020).

O prazo para execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão desta da ordem de serviço (21/02/2020 a 27/07/2020).

Valor: O valor deste contrato é de **RS 803.054,66 (oitocentos e três mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)**.

Macapá-AP, 21 de fevereiro de 2020.


Raimundo Brazão do Rosário
Assessor Especial de Eng. e Arquitetura
Port. 1680/2018-UNIFAP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO
CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140
ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

6. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 03/02/2020 | Edição: 23 | Seção: 3 | Página: 90
Órgão: Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Amapá

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2020 - UASG 154215

Nº Processo: 23125033391201956.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO - AMAPA. CNPJ Contratado: 10843518000140. Contratado : CANTUARIA & CIA LTDA -Objeto: Reforma e ampliação da UBS-Marco Zero. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 03/02/2020 a 30/09/2020. Valor Total: R\$803.054,66. Fonte: 8188000000 - 2019NE800599. Data de Assinatura: 22/01/2020.

(SICON - 31/01/2020) 154215-15278-2019NE800005

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO

CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140

ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

PORTARIA Nº 0259/2020

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regimentais e em observação ao disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993; no art. 31 da Instrução Normativa nº 02/2008 - MPOG, alterado pela Instrução Normativa nº 06/2013 - MPOG, tendo em vista o que consta no Processo Nº 23125.035031/2019-99, de 10 de Dezembro de 2019, e no Despacho Nº 3999/2020 - SECPREF, de 17 de Fevereiro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores constantes em anexo para responderem pela gestão e fiscalização do Contrato nº 016/2020, celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ e a Empresa CANTUÁRIA & CIA LTDA ME, o qual tem como objeto "a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Marco Zero, Município de Macapá-AP, que será prestado nas condições estabelecidas nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual".

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Pró-Reitoria de Administração da Fundação Universidade Federal do Amapá

Homologado em 17/02/2020 por 1125822 - SELONIEL BARROSO DOS REIS, com as atribuições conferidas pelo(a) Portaria nº 1610/2018-UNIFAP, e pelo(a) Ordem de Serviço nº 001/2016-REITORIA/UNIFAP.

ANEXO DA PORTARIA

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2020
EMPRESA CANTUÁRIA & CIA LTDA — ME

Servidor	Cargo Efetivo	Matrícula SIAPE	Função
Raimundo Brazão do Rosário	Arquiteto e Urbanista	2001390	Gestor(a) do Contrato
Cairo Cardoso Madureira	Arquiteto e Urbanista	2082250	Gestor(a) do Contrato (Suplente)
Cristiane Lameira Vasconcellos	Engenheira Civil	1790220	Fiscal Técnico
Amanda Monteiro Pinto Barros	Engenheiro de Segurança do Trabalho	3065496	Fiscal Técnico
João Ricardo Brito Pinheiro	Engenheiro Eletricista	1937279	Fiscal Técnico
Amanda Letícia Batista da Silva	Engenheira Sanitarista	1362145	Fiscal Técnico
Cledinei Santana Amanajás	Engenheiro Civil	2158032	Fiscal Técnico (Suplente)
Gustavo Hebron Pinheiro Menezes	Técnico em Segurança do Trabalho	2281488	Fiscal Técnico (Suplente)
Alex Carlos Silva da Silva	Auxiliar em Enfermagem	3055377	Fiscal Administrativo
José Adolfo Homobono Machado Bittencourt	Farmacêutico	1652610	Fiscal Administrativo (Suplente)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO
 CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140
 ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA INICIAL

		Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	95,29%	1,57%	1,57%	1,57%
		43.235,01	41.198,64	678,79	678,79	678,79
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		87.350,62	43.675,31	43.675,31		
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%	10,00%	40,00%	50,00%	
		34.076,42	3.407,64	13.630,57	17.038,21	
4	COBERTURA E FORRO	100,00%	15,00%	50,00%		35,00%
		55.802,44		8.370,37	27.901,22	19.530,85
5	ESQUADRIAS	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		47.855,74		14.356,72	19.142,30	14.356,72
6	REVESTIMENTOS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		61.130,79		12.226,16	30.565,40	18.339,24
7	PINTURA	100,00%			30,00%	70,00%
		16.563,78			4.969,13	11.594,65
8	LOUÇAS E METAIS	100,00%				100,00%
		17.212,04				17.212,04
9	EQUIPAMENTOS	100,00%			30,00%	70,00%
		123.725,23			37.117,57	86.607,66
11	INSTALAÇÕES	100,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
		189.729,27	18.972,93	75.891,71	75.891,71	18.972,93
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		44.615,08				44.615,08
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	14,63%	23,75%	29,84%	31,78%
		81.758,24	11.961,23	19.417,58	24.396,66	25.982,77
Porcentagem			14,85%	23,44%	29,6%	32,11%
Custo			119.215,75	188.247,20	237.700,98	257.890,73
Porcentagem Acumulado			14,85%	38,29%	67,89%	100,0%
Custo Acumulado			119.215,75	307.462,95	545.163,93	803.054,66

Paulo Sérgio da Silva Melo
 CPF: 104.323.572-04
 Administrador - CREA nº 0-01273
 Tec em Edificações - CREA 031132973-2



SANTANA-AP, 30 DE DEZEMBRO DE 2019



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO
CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140
ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

IMPLANTAÇÃO

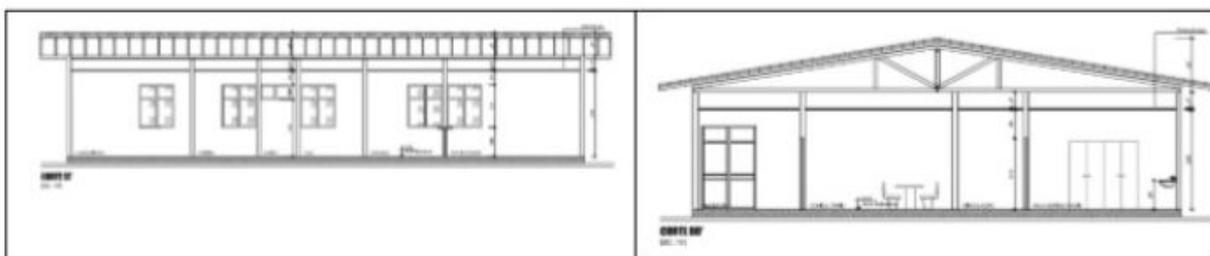
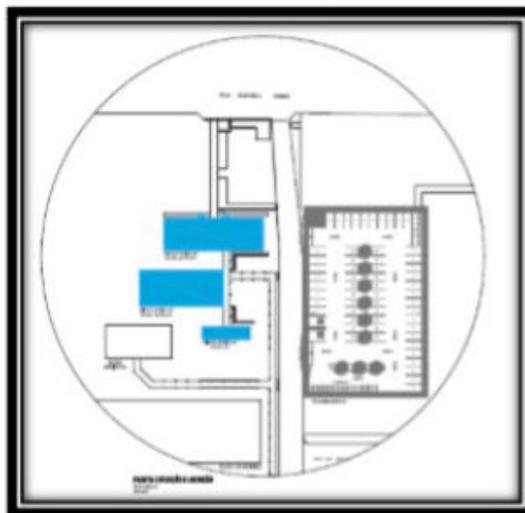


BLOCOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO
CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140
ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

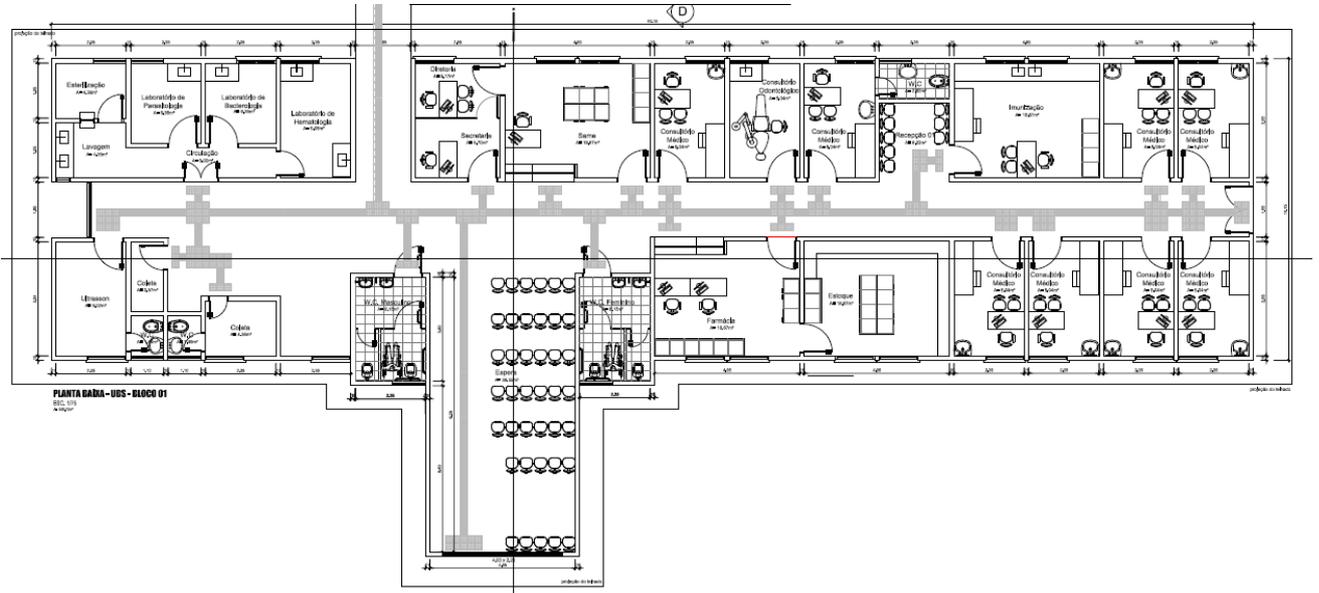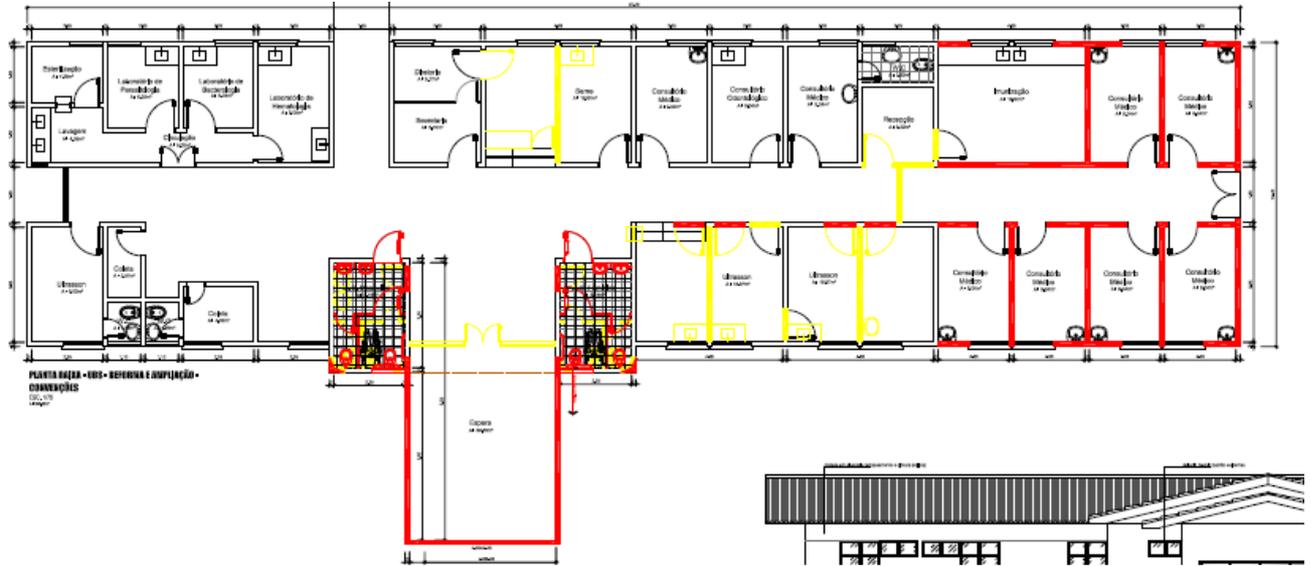


Bloco 1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO
CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140
ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

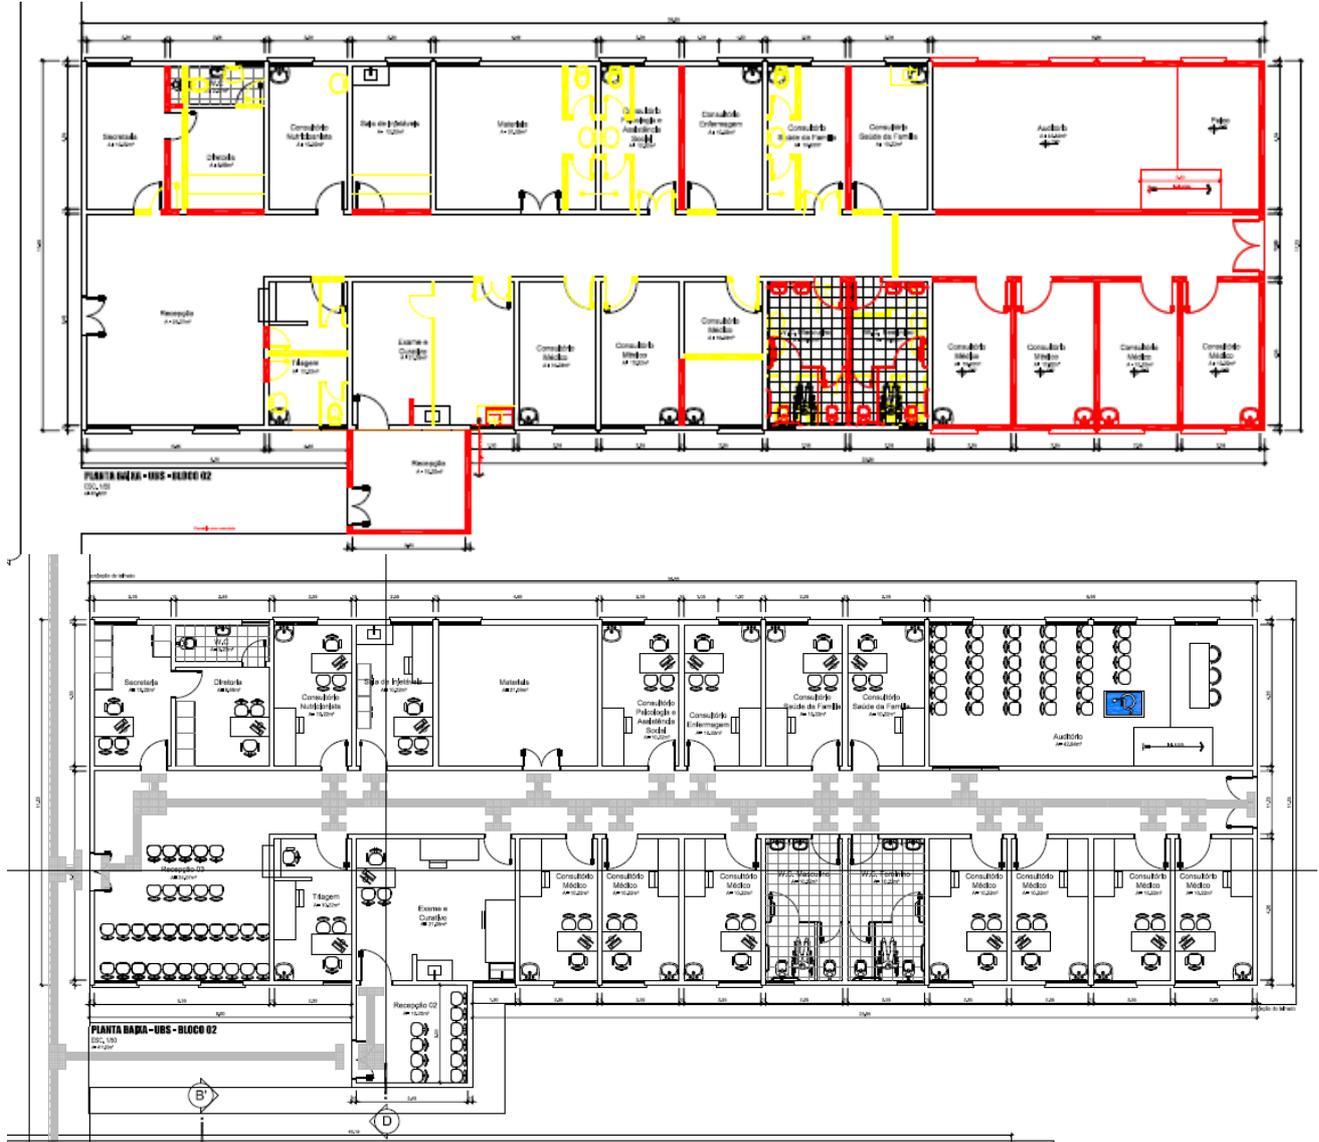


Bloco 2



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO
CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140
ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

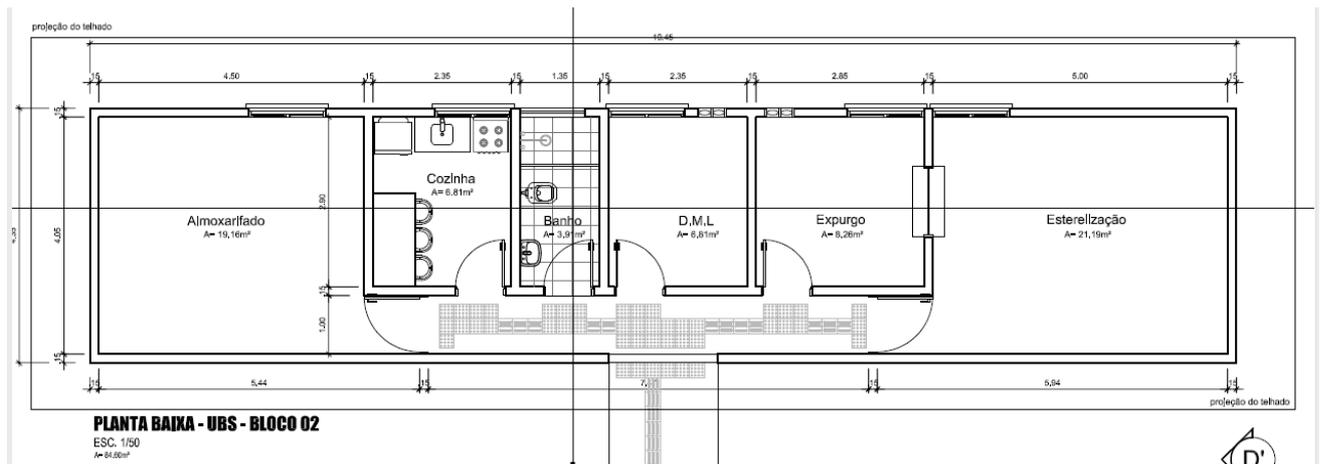

Bloco 3



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO
CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140
ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

9. HISTÓRICO DE MEDIÇÕES

	PREVISTO	ACUMULADO	REALIZADO	ACUMULADO	SALDO
MEDIÇÃO 01	R\$ 119.215,75	R\$ 119.215,75	R\$ 75.777,78	R\$ 75.777,78	R\$ 727.276,88
MEDIÇÃO 02	R\$ 188.247,20	R\$ 307.462,95	R\$ 210.943,13	R\$ 286.720,91	R\$ 516.333,75
MEDIÇÃO 03	R\$ 237.700,98	R\$ 545.163,93	R\$ 93.554,95	R\$ 380.275,86	R\$ 422.778,80
MEDIÇÃO 04	R\$ 257.890,73	R\$ 803.054,66	R\$ 211.369,91	R\$ 591.645,77	R\$ 211.408,89
MEDIÇÃO 05					
	R\$ 803.054,66		R\$ 591.645,77		

10. AJUSTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ Supressões e aditamentos

Prezados Gestores,

1. Em atenção à Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020, que trata da *planilhas de aditivo para apreciação e solicitamos o aditivo de prazo por mais 60(sessenta) dias, visto que o contrato supracitado se encerrará no dia 27.07.2020*, advertimos que:

2. Considerando que a comissão está em análise sobre o pedido de aditivo (acréscimo e supressão) de serviços, não se verifica óbice a prorrogação do prazo, tanto em função dos ajustes em planilha final da obra como em razão dos impactos ocasionados pela pandemia COVID-19 durante a execução da obra.

3. Por fim, é importante lembrar que antes da entrega da final da obra, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

- i. Projetos e ART (arquitetura, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias, combate a incêndio, manuais e outros documentos) de as built da obra;
- ii. Protocolos e documentos de HABITE-SE junto a Prefeitura da Macapá;
- iii. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros.
- iv. Notas fiscais dos equipamentos de ar condicionado;

4. Todas as alterações estão condicionadas a anuência e à autorização dos gestores deste contrato.

É o que temos.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

CONTRATO: 16/2020 – REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO

CONTRATADA: CANTUARIA & CIA LTDA – CNPJ 10843518000140

ASSUNTO: Carta Cantuária e Cia Ltda. nº 30/2020, de 14 de julho de 2020 (aditivo e prazo)

11. REGISTRO FOTOGRAFICO

Os registros fotográficos lançados no SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle de Obra do Ministério da Educação, sob o número ID 47706, assim como os documentos diversos relacionados ao contrato.

Macapá – AP, 27 de julho de 2020.
Cristiane Lameira Vasconcellos
Fiscalização Técnica



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 27/07/2020 18:47



DOCUMENTO
23125.013710/2020-24

Cadastrado em 27/07/2020 18:46



Documento disponível para recebimento com
código de barras/QR Code

Número:

99/2020

Unidade de Origem:

DIVISÃO DE PROJETO - DIVPROJ (11.02.23.05.03)

Identificador:

relatório

Ano:

2020

Tipo do Documento:

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

Assunto Detalhado:

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 16/2020

Nome(s) do Interessado(s):

SECRETARIA DA PREFEITURA - SECPREF

E-mail:

Identificador:

1102230505

Observação:

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

Data Envio	Destino
27/07/2020 18:46	SECRETARIA DA PREFEITURA - SECPREF (11.02.23.05.05)

SIPAC | Copyright © 2005-2020 - Superintendência de Informática - UFRN - (096)3312-1733 - sig-instancia-04.unifap.br.srv4inst1
